

DaX

Vue d'ensemble des délais Release DaX R1/2019 V1.0

But du document

Le présent document offre une vue d'ensemble des délais du processus de Release DaX.
Les étapes du processus mentionnées correspondent aux processus DaX Change Management et DaX Release Management dans la version 1.12. Ces processus sont disponibles dans le document [«Processus d'exploitation DaX»](#).

Des informations plus précises sur le processus de Release DaX sont disponibles dans la DaX Release Policy : [DaX Release Management](#)

Contrôle des modifications

Version	Date	Service exécutant	Remarques / type de modification
1.0	06.11.2018	Secrétariat DaX	Secrétariat DaX, version finale


Sommaire

1. Vue d'ensemble des délais du Release DaX R1/2019	3
2. Délais test DaX E2E DaX-AS1 pour R1/2019	4
3. Délai pour l'approvisionnement de l'application de commande en données de base (production) R1/2019	6

1. Vue d'ensemble des délais du Release DaX R1/2019

Vue d'ensemble

- Délai de remise des RfC: **29.03.2018**
- Développement défini (clôture de la spécification sommaire): **15.06.2018**
- Commande définitive du Release: **27.07.2018**
- Début du développement: **01.08.2018**
- Fin du développement **DAX-D1**: **14.12.2018**
- Fin du développement **DAX-AS1**: **01.03.2019**
- Tests + réception **DAX-D1**: **janvier 2019**
- Tests + réception **DAX-AS1**: **mars/avril 2019**

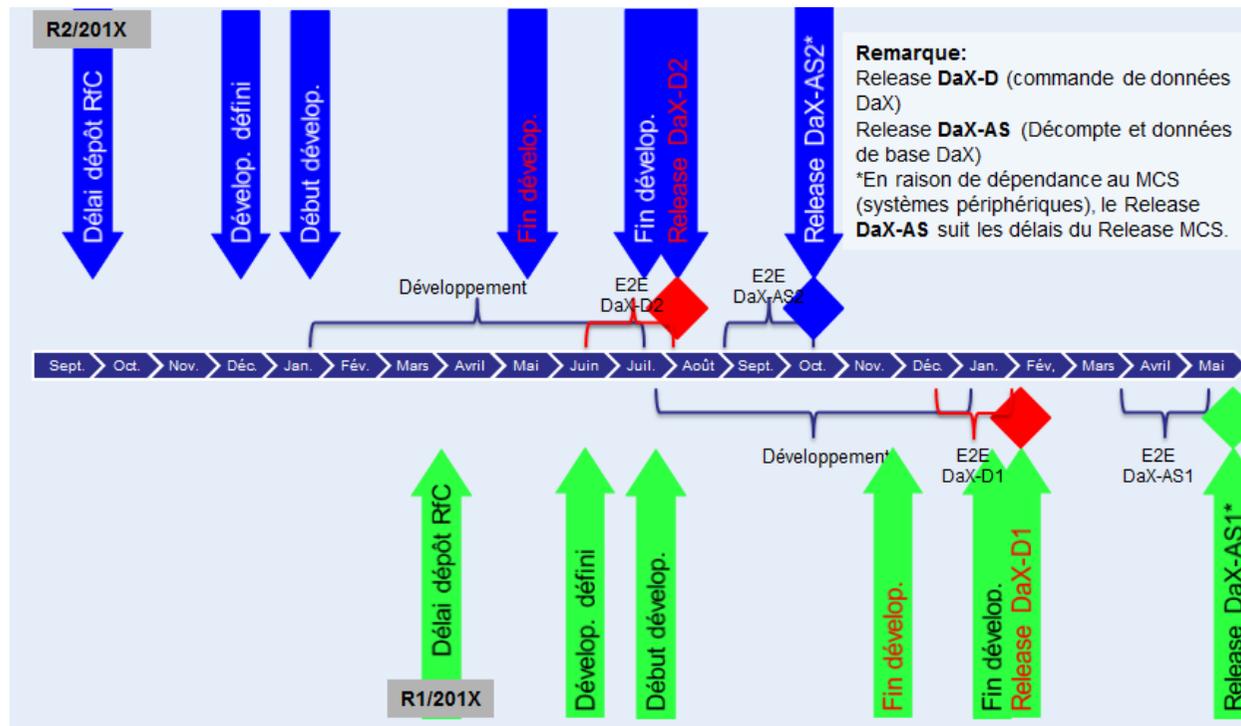

2. Délais test DaX E2E DaX-AS1 pour R1/2019

Vue d'ensemble des délais test E2E DaX-AS1 pour le Release 1/2019					
Processus	ID processus	Description	Date	Responsable	Remarques
DaX Release Management I	1.6	Définition des contenus des tests E2E	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 11.02.2019 	Release Manager (UTP) en collaboration avec BLS, CFF	Les CFF et le BLS fournissent au Release Manager les bases concernant les contenus des tests afin que la DaX Release Policy puisse être adaptée si Nécessaire et que les partenaires de test puissent être informés.
DaX Release Management I	1.7	Information des partenaires de test sur la procédure des tests E2E	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 13.02.2019 	Release Manager UTP	Les informations sur le test E2E sont transmises aux partenaires de test.
Test E2E DaX	1.0	Préparation des données test	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 du 01.03.2019 au 12.03.2019 	Partenaires DaX (administrateur du Backend partenaire)	La commande de données test doit être saisie dans l'application de commande DaX dans l'environnement d'intégration. https://dax-i.bls.ch/dop
Test E2E DaX	1.0.1	E2ET- lancement de la commande de Backend – PAS AVANT le 13.03.2018!	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 le 13.03.2019 	Partenaires DaX (administrateur du Backend partenaire)	
Test E2E DaX	1.1+1.2	Mise à disposition des données de test commandées sur le FTPS	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 du 14.03.2019 au 15.03.2019 	Système CFF et gestion des données CFF	Les définitions d'articles et les listes d'arrêts doivent être préparées manuellement par la gestion des données CFF et déposées sur le FTPS respectif des partenaires de test.
Test E2E DaX	1.3+1.4	Information à l'administrateur du Backend partenaire: données test prêtes sur le serveur FTP	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 jusqu'au 18.03.2019 	Application de commande secrétariat DaX	L'application de commande DaX envoie une information dès que les produits commandés sont sur le serveur FTP. Le secrétariat DaX envoie une information dès que la gestion des données CFF a déposé les listes d'arrêts et les définitions d'articles sur le serveur FTP.

Vue d'ensemble des délais test E2E DaX-AS1 pour le Release 1/2019

Processus	ID processus	Description	Date	Responsable	Remarques
Test E2E DaX	1.5	Importation des données test	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 jusqu'au 28.03.2019 	Partenaires DaX	Les données test mises à disposition sont importées dans les systèmes des partenaires DaX. Important: importer les données seulement lorsque les définitions d'articles sont prêtes sur le serveur FTP.
Test E2E DaX	1.7	Information au secrétariat DaX si l'importation n'est pas réussie.	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 jusqu'au 29.03.2019 	Partenaires DaX	Si les données test ne peuvent pas être importées jusqu'à cette date, le secrétariat DaX doit impérativement en être informé. Le secrétariat DaX informe immédiatement les fournisseurs BLS et CFF (xp701 / lzspos) afin de lancer les étapes éventuellement nécessaires.
Test E2E DaX	1.8	Ventes test	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 jusqu'au 11.04.2019 	Partenaires DaX	
Test E2E DaX	2.0	Réalisation et livraison du Sale Report	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 12.04.2019 	Partenaires DaX	Livraison du Sale Report exactement le 13.04.2018
Test E2E DaX	2.1 -2.2	Réalisation du test de décompte et élaboration du rapport de test	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 jusqu'au 26.04.2019 	CFF	Le rapport de test est remis au secrétariat DaX pour transmission aux partenaires DaX.
Test E2E DaX	2.3	Remise du rapport de test aux partenaires DaX	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 jusqu'au 03.05.2019 	Secrétariat DaX	
DaX Release Management II	1.9 - 2.1	Evaluation des résultats de test et correction des éventuels Blockers	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 <ol style="list-style-type: none"> a.) CFF jusqu'au 17.05.2019 b.) Partenaires DaX jusqu'au 31.05.2019 	Backends CFF / BLS / partenaires DaX	Si les Blockers ne peuvent pas être corrigés, il faut l'annoncer au secrétariat DaX afin qu'il puisse convoquer un Sounding Board DaX extraordinaire pour définir la marche à suivre (Fallback, etc.).
DaX Release Management II	2.4	Validation formelle du Release	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 jusqu'au 15.05.2019 	Release Manager (UTP)	Aux fournisseurs BLS et CFF
DaX Release Management II	2.6	Mise en ligne du Release en production	<ul style="list-style-type: none"> • Release DAX-AS1 16.05.2019 	CFF/BLS	

Vue d'ensemble des délais test E2E DaX-AS1 pour le Release 1/2019

Processus	ID processus	Description	Date	Responsable	Remarques
DaX Release Management II	2.8	Mise à disposition de la documentation du Release	<ul style="list-style-type: none"> Release DAX-AS1 16.05.2019 	Secrétariat DaX	Les documents de Release définitifs sont remis aux partenaires DaX. Publication complémentaire sur l'Extranet SD.

3. Délai pour l'approvisionnement de l'application de commande en données de base (production) R1/2019

Délai pour l'approvisionnement de l'application de commande en données de base (production) R1/2019

Processus	ID du processus	Description	Date	Responsable	Remarques
Approvisionnement de l'application de commande DaX	1.0	Annonce au BLS que les données de base sont prêtes pour l'approvisionnement de l'application de commande DaX.	<ul style="list-style-type: none"> Au plus tard le 01.03.2019 	Gestion des données CFF	Les données de base doivent être prêtes jusqu'à cette date.

Remarque: Le secrétariat DaX informe les administrateurs des Backends partenaires lorsque les commandes pour l'état des données de 01.06.2019 peuvent être saisies dans l'environnement de production de l'application de commande DaX.
